


Перелік робіт по перенесенню щитового будиночка за адресою: м. Васильків, с/т "Мрія"


№ п/п	Тип робіт	Найменування	к-ть	одиниці	Ціна за одиницю	Загальна вартість
1	демонтаж	Розбирання покрівлі	55	м ²		0
2	демонтаж	Демонтаж зовн. Облицювання будівлі (пласт. Сайдинг)	84	м ²		0
3	демонтаж	Двері вхідні	1	шт.		0
4	демонтаж	Вікно металопластиковепластикове	2	шт.		0
5	демонтаж	Вікно дерев'яне	2	шт.		0
6	демонтаж	Двері міжкімнатні металопластик	1	шт.		0
7	демонтаж	Двері міжкімнатні дерево	2	шт.		0
8	демонтаж	Розбирання зовнішніх стін	84	м ²		0
9	демонтаж	Перекриття між 1м та 2м поверхом	31,5	м ²		0
10	демонтаж	Перекриття (підлога) 1-го поверху	31,5	м ²		0
11	демонтаж	Розбирання внутрішніх стін (перегородок)	34	м ²		0
12	демонтаж	Демонтаж внутр. Облицювання стін (гіпсокартон по дереву)	118	м ²		0
13	фундамент	Розділення (розрізання) з/б балок на частини	4	шт.		0
14	фундамент	Розмітка котловану	1	шт.		0
15	фундамент	Копання траншеї (мех. Способом) ширина 0,85м, глибина 1м	18,7	м ³		0
16	фундамент	Улаштування гравійної подушки товщиною 100мм з трамбуванням	18,7	м ²		0
17	фундамент	Улаштування піщаної подушки товщиною 100мм з трамбуванням	18,7	м ²		0
18	фундамент	Монтаж з/б балок в траншею	4	шт.		0
19	фундамент	Зворотня засипка траншеї	5	м ³		0
20	транспортні	Завантаження конструкцій будівлі в транспорт	1	компл.		0
21	транспортні	Розвантаження конструкцій будівлі на об'єкті	1	компл.		0
22	Монтаж	Перекриття (підлога) 1-го поверху	31,5	м ²		0
23	Монтаж	Зведення зовнішніх стін	84	м ²		0
24	Монтаж	Перекриття між 1м та 2м поверхом	31,5	м ²		0
25	Монтаж	Зведення внутрішніх стін (перегородок)	34	м ²		0
26	Монтаж	Влаштування покрівлі	55	м ²		0
27	Монтаж	Двері вхідні	1	шт.		0
28	Монтаж	Вікно металопластиковепластикове	2	шт.		0
29	Монтаж	Вікно дерев'яне	2	шт.		0
30	Монтаж	Двері міжкімнатні металопластик	1	шт.		0
31	Монтаж	Двері міжкімнатні дерево	2	шт.		0






ПОДЕРЖИВАЮЩИЙ ПЛАН
 на фундаменте

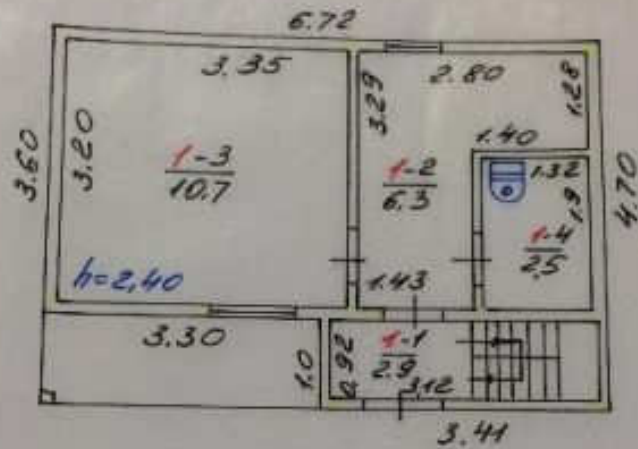

Мансарда

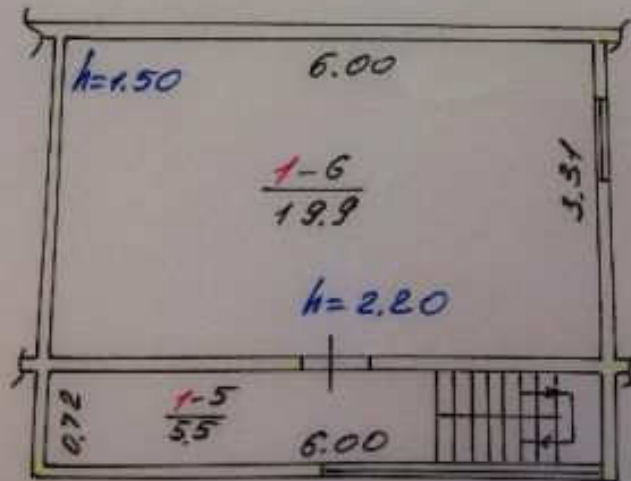

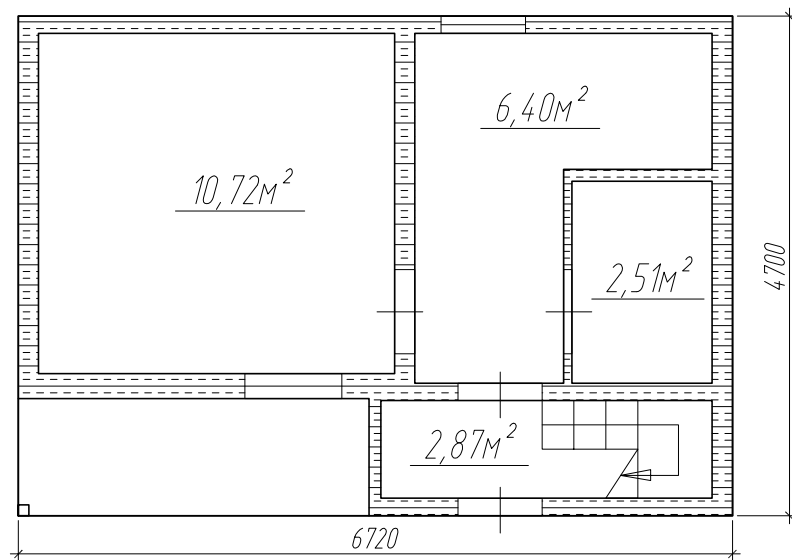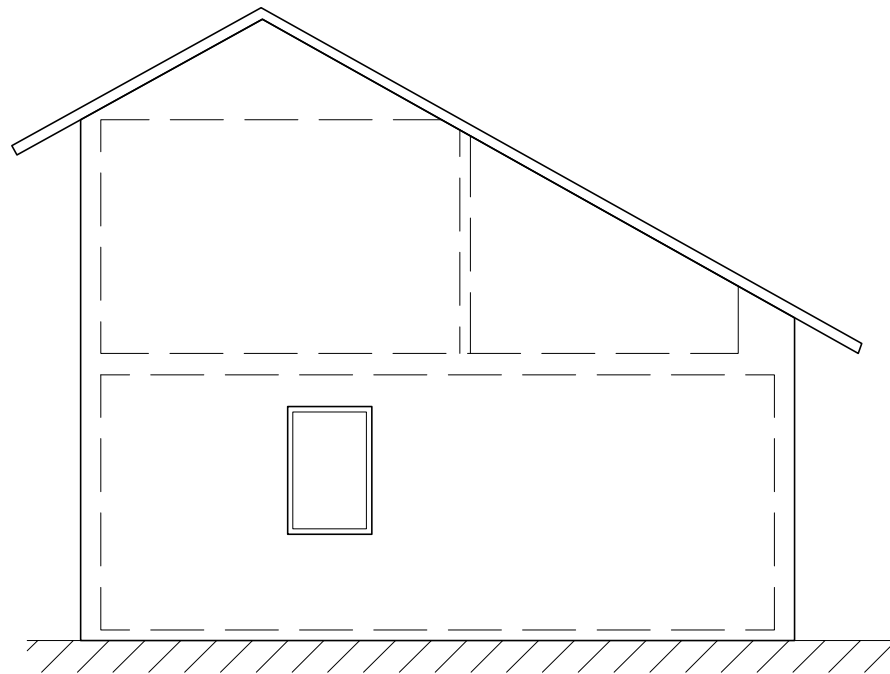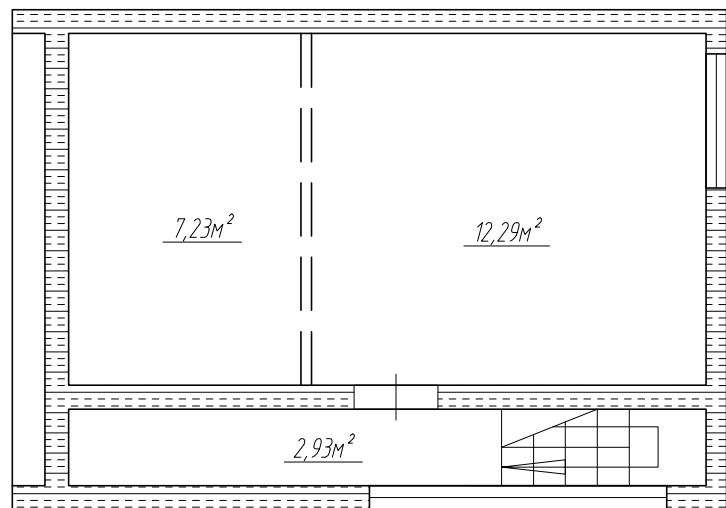

Параметри будівлі:

	ПЛОЩА, м.кв.		КУБАТУРА, м.куб.	
	повна	чиста	повна	чиста
стіна північна	31,44	30,49	3,144	3,049
стіна південна	31,44	25,3	3,144	2,53
стіна схід	23,03	22,19	2,303	2,219
стіна захід	6,36	6,36	0,636	0,636
ВСЬГО СТІНИ	92,27	84,34	9,227	8,434
покрівля схід	15,812	15,812	3,1624	3,1624
покрівля захід основна	39,766	39,766	7,9532	7,9532
ВСЬГО ПОКРІВЛЯ	55,578	55,578	11,1156	11,1156
Перегородки 1ї поверх	16,08	13,28	1,608	1,328
Перегородки 2ї поверх	17,94	15,14	1,794	1,514
ВСЬГО ПЕРЕГОРОДКИ	34,02	28,42	3,402	2,842
Площа 1ї поверх	27,95	22,5	67,08	54
Площа 2ї поверх	31,58	22,45		
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА	59,53	44,95	67,08	54
Площа забудови	47,26	31,58		
